

e Government
St. Gallen digital.

Erfa-Stammtisch «Digitale Präsenz in Gemeinden»

Projekt «Zukünftige Internetauftritte»

St. Gallen, 23. Januar 2025

Agenda

01

Wer sind wir?

02

Vorprojekt

03

Ausschreibung

04

**Vorgehen Projekt
und Einführung**

05

Lessons Learned

06

Q&A

Wer sind wir?



Nathalie Kern

IT Projektleiterin
eGovernment St.Gallen digital.



Lea Thalmann

Fachfrau E-Government
Gemeinde Jonschwil

Vorprojekt

- Es wurde ein Vorprojekt initialisiert mit unterschiedlichen Gemeinde-, Städte- sowie Kantonsvertretungen.
- Durch eine gemeinsame Ausschreibung sollen 30% Kosteneinsparung realisiert werden und Synergien genutzt werden.
- Es wurde sich für Variante 3a oder Variante 3b entschieden.

V1: Ansatz 'Raiffeisen'	V2: Gemeinsames Design	V3a: Produkt inkl. Customizing + Support	V3b: Produkt exkl. Customizing + Support	V4: IST-Situation
Inhalte	Inhalte	Inhalte	Inhalte	Inhalte
Design	Design	Design	Design	Design
Customizing + Support	Customizing + Support	Customizing + Support	Customizing + Support	Customizing + Support
Bausteine, Komponenten	Bausteine, Komponenten	Bausteine, Komponenten	Bausteine, Komponenten	Bausteine, Komponenten
Technischer Betrieb	Technischer Betrieb	Technischer Betrieb	Technischer Betrieb	Technischer Betrieb
Produkt inkl. Pflege und Wartung	Produkt inkl. Pflege und Wartung	Produkt inkl. Pflege und Wartung	Produkt inkl. Pflege und Wartung	Produkt inkl. Pflege und Wartung
Zwingende Vorgaben	Zwingende Vorgaben	Zwingende Vorgaben	Zwingende Vorgaben	Zwingende Vorgaben


← Gemeinsamer Ansatz | Individuelle Ansätze →

Ausschreibung

- Mit den gleichen Gemeinde-, Städte sowie Kantonsvertretungen aus dem Vorprojekt wurde die Ausschreibung erstellt.
- Der Ausschreibungskatalog umfasste sämtliche Funktionalitäten, so dass die grösseren Städte sowie der Kanton sich ebenfalls beteiligen kann in den nächsten Jahren. Aufgrund rechtlicher Abklärungen war dies leider nicht mehr möglich.
- Es wurden alle Gemeinden angefragt, ob sie sich an der Umfrage beteiligen möchten. 17 Gemeinden sowie eGov haben sich für das Projekt gemeldet.
- Die eingegangenen Offerten waren folgende. Der i-Web wurde der Zuschlag erteilt.


Nr.	Bezeichnung des Anbieters	Datum der Einreichung (Poststempel)	Eingangsdatum	Eingabesumme ohne MwSt.	Rabatt	Skonto	Eingabesumme netto inkl. MwSt.	Bemerkungen
01	Anbieterin 01	27.02.2024		749'550.00	30'000.00		810'263.55	
02	Anbieterin 02	28.02.2024		231'232.00	30'300.00		249'961.79	
03	Anbieterin 03		01.03.2024, 09:10 Uhr	1'228'616.35	216'814.65		1'328'134.27	
04	Anbieterin 04		01.03.2024, 11:53 Uhr	839'529.89			907'531.81	

Vorgehen Projekt

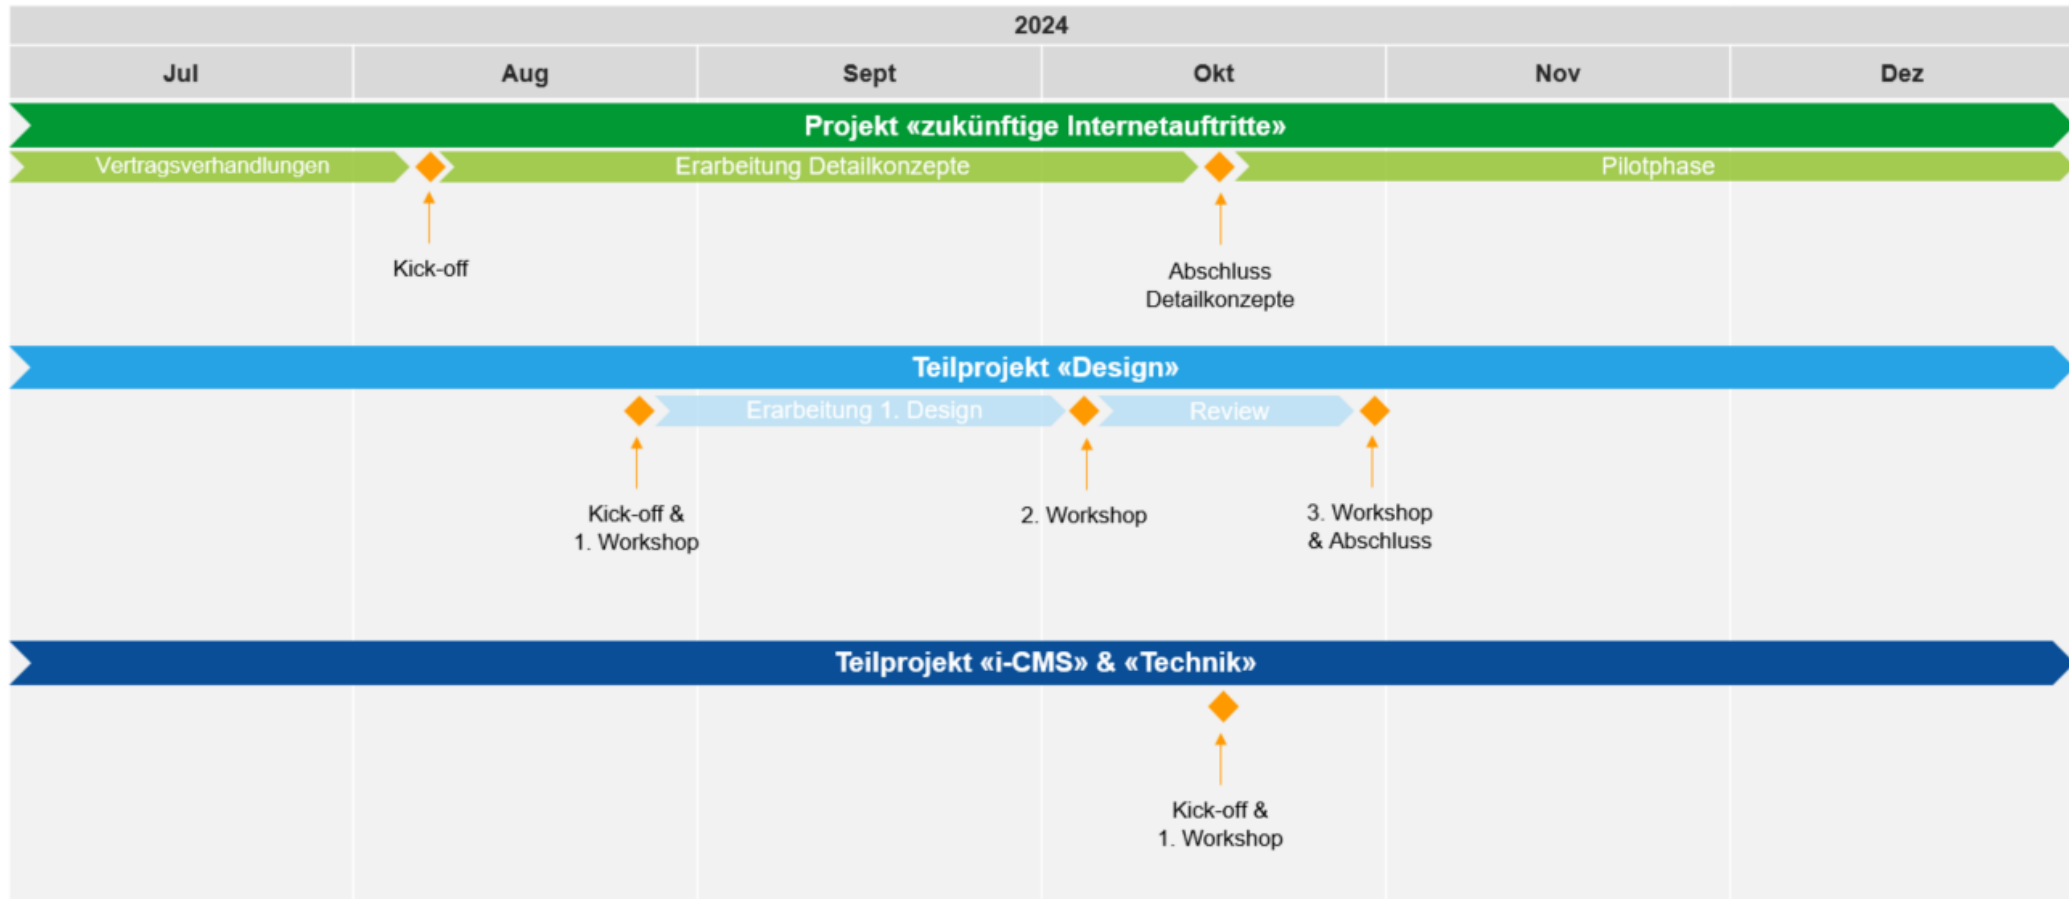

Projekt zukünftige Internetauftritte

Teilprojekt Design

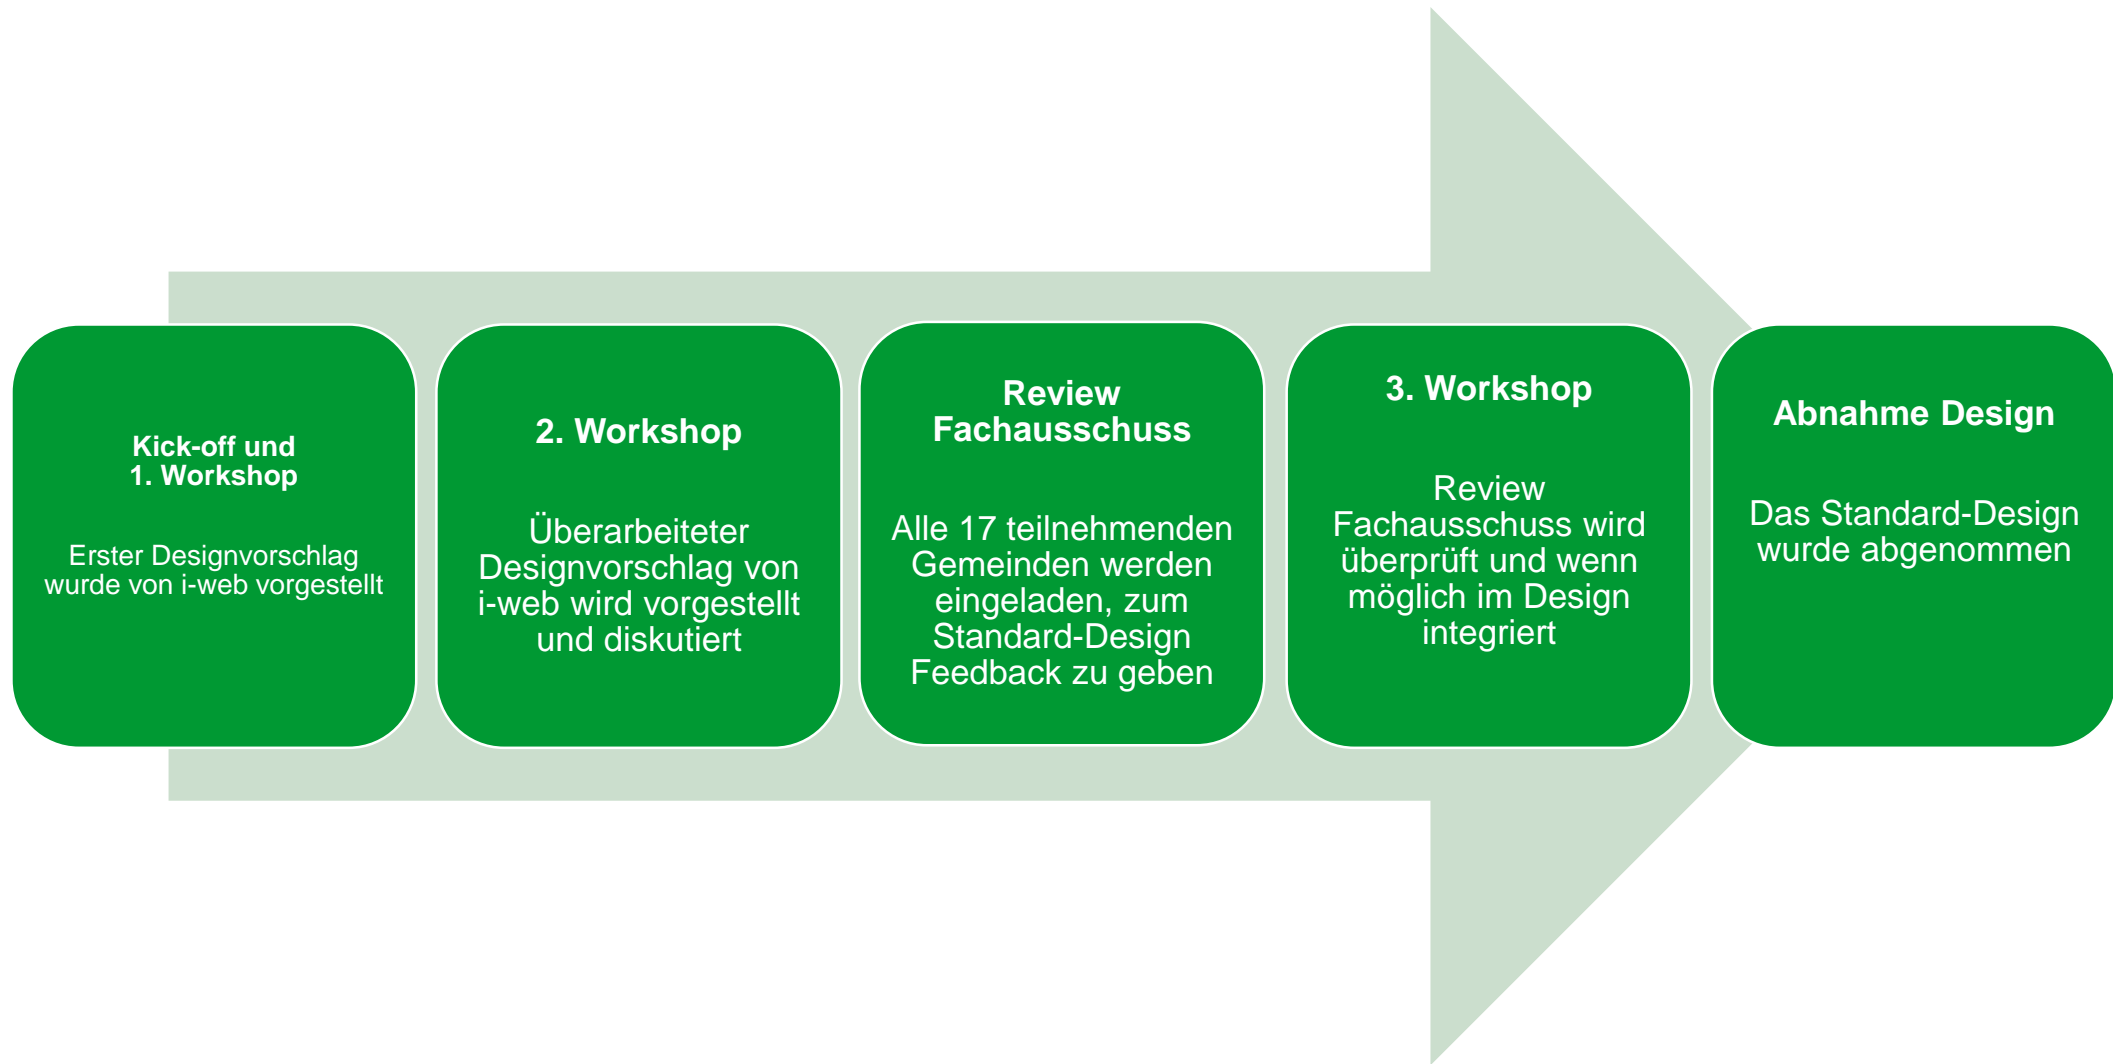

Vorgehen Einführung

- Die Gemeinde Jonschwil wurde als Pilot definiert.
- Die restlichen Gemeinden werden in unterschiedlichen Tranchen eingeführt.
- Zusätzlich wird das Servicemanagement aufgebaut, damit das Projekt reibungslos in den Betrieb übergehen kann.



Lessons Learned

Ausschreibung

- Anforderungen teilweise zu spezifisch auf bestehende Produkte formuliert
- Einbindung der strategischen E-Government Basisservices hat es verkompliziert
- Strategischer Druck auf Anbieterin

Vereinheitlichung

- Service Managerin als zentrale Anlaufstelle
- Standardisierung der im Einsatz stehenden Module
- Standardisierung des Designs

Kosteneinsparungen

- Kosten für Gemeinden tiefer, Zusatzmodule verursachen jedoch weitere Kosten

Fragen?

